

○燃焼ガス冷却設備（2号炉）



ボイラ保温施工中

○燃焼設備（2号炉）




焼却炉ケーシング据付後

○燃焼設備（2号炉）



焼却炉ケーシング据付後

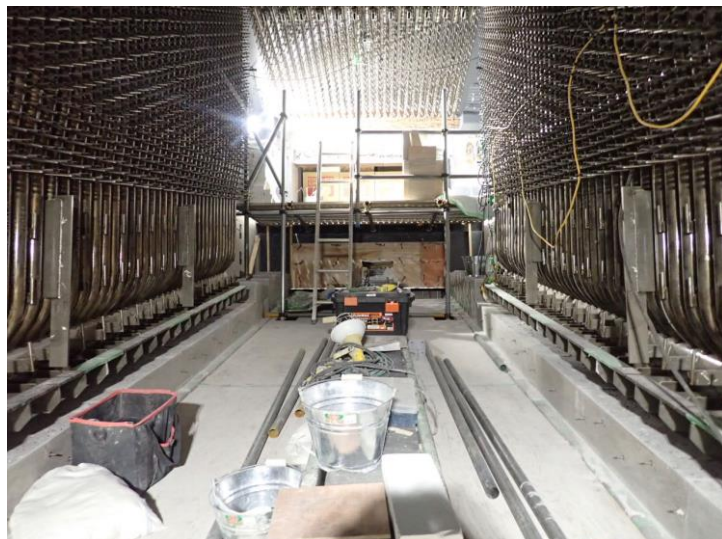

焼却炉耐火物施工中

○燃焼設備（2号炉）



焼却炉耐火物施工中

◆令和6年4月～令和6年5月

3月より引き続きボイラ保温工事を継続しております。4月より焼却炉ケーシング、ボイラ耐火物、焼却炉耐火物の施工を行いました。また3号炉において1炉運転時（熔融炉運転）のCO2削減検証を実施し、合格致しました。

◆令和6年6月～

6月は引き続きボイラ保温工事、焼却炉ケーシング、ボイラ耐火物の施工を行います。

7月12日より乾燥焼き及び温水洗浄を行います。

8月より試運転、性能試験を行い、10月末には2号炉引渡しの予定です。
